云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026　　No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	云南省易门县华三铜业有限责任公司	01.固定式空气压缩机	Q/YNGH-RE01-26038	李若胜	赵艳川	2026/4/14	2026/5/7	合格
2	云南省易门县华三铜业有限责任公司	10.主通风机	Q/YNGH-RE10-26037	李若胜	赵艳川	2026/4/14	2026/5/7	合格
3	云南省易门县华三铜业有限责任公司	11.通风系统	Q/YNGH-RE11-26019	李若胜	赵艳川	2026/4/14	2026/5/7	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE01-26038

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位：云南省易门县华三铜业有限责任公司

受 检 单 位：云南省易门县华三铜业有限责任公司大尖山铜矿

设 备 名 称：螺杆空气压缩机

型 号 规 格：LS16-100L

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 4 月 14 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE01-26038　　共 11 页　第 1 页

委托单位	名称	云南省易门县华三铜业有限责任公司		
	地址	云南省玉溪市易门县		
设备名称		螺杆空气压缩机	设备编号	C03-C07435（出厂编号）
型号规格		LS16-100L	出厂日期	2005 年 4 月
制造单位		深圳寿力亚洲实业有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		2023 中段硐口空压机房	检测检验日期	2026 年 4 月 14 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	云南省易门县华三铜业有限责任公司大尖山铜矿		
	地址	云南省玉溪市易门县铜厂乡		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 1 部分：固定式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论					
	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜4	C 类不合格项＜7	B+C 类不合格项＜7
	检测结果	0	1	1	2
	综合判定：合格				

（检测检验专用章）

2026 年 5 月 6 日

检测检验组成员	李若胜、赵艳川
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 4 月 13 日

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.5.6　　日期：2026.5.6　　日期：2026.5.6

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE10-26037

金属非金属矿山在用主通风机系统

安全检测检验报告

委 托 单 位：云南省易门县华三铜业有限责任公司

受 检 单 位：云南省易门县华三铜业有限责任公司大尖山铜矿

设 备 名 称：节能轴流通风机

型 号 规 格：K40-4№11/30

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 4 月 14 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用主通风机系统安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE10-26037　　共 9 页　第 1 页

委托单位	名称	云南省易门县华三铜业有限责任公司		
	地址	云南省玉溪市易门县		
设备名称		节能轴流通风机	设备编号	1#（出厂编号：901）
型号规格		K40-4№11/30	出厂日期	2023 年 9 月
制造单位		萍乡市南风风机厂		
设备状态		在用		
检测检验地点		2070 中段主回风巷主风机硐室	检测检验日期	2026 年 4 月 14 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	云南省易门县华三铜业有限责任公司大尖山铜矿		
	地址	云南省玉溪市易门县铜厂乡		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》 GB 16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		

检测检验结论					
	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜3	C 类不合格项＜5	B+C 类不合格项＜5
	检测结果	0	0	0	0
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 6 月 6 日				
检测检验组成员	李若胜、赵艳北				
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 4 月 13 日				

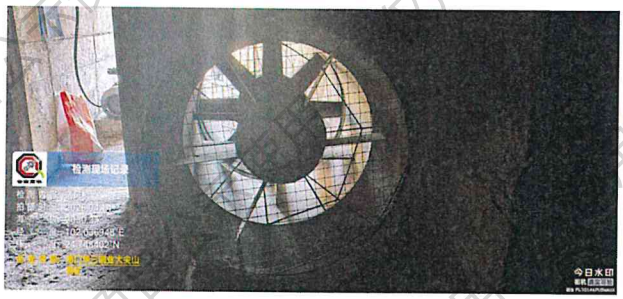
批准：胡春林　日期：2026.5.6

审核：饶科元　日期：2026.5.6

主检：赵艳北　日期：2026.5.6

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE11-26019

金属非金属地下矿山通风系统

检测鉴定报告

委 托 单 位：云南省易门县华三铜业有限责任公司

受 检 单 位：云南省易门县华三铜业有限责任公司大尖山铜矿

项 目 名 称：大尖山铜矿通风系统检测鉴定

检测检验地点：大尖山铜矿矿井系统

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 4 月 14 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属地下矿山通风系统检测鉴定报告

报告编号：Q/YNGH-RE11-26019　　共 29 页　第 1 页

委托单位	名称	云南省易门县华三铜业有限责任公司		
	地址	云南省玉溪市易门县		
项目名称		大尖山铜矿通风系统检测鉴定		
生产规模		5 万吨/年	主通风机数量（台）	1
检测项目状态		矿井处于待复工复产，现场检测时主通风机正常运行		
检测检验地点		大尖山铜矿矿井系统	检测检验日期	2026 年 4 月 14 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	云南省易门县华三铜业有限责任公司大尖山铜矿		
	地址	云南省玉溪市易门县铜厂乡		
检测鉴定项目		风量（风速）合格率、风源风质合格率、作业场所空气质量合格率、有效风量率、风机效率、风量供需比、综合指标。		
检测鉴定依据		1、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 2、KA 30-2026《金属非金属地下矿山通风技术规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测鉴定结论		依据以上标准规范要求，对该矿通风系统进行了检测鉴定，结果详见第 3 章“检测检验项目”。 **综合判定：**该矿通风系统综合指标合格。 （检测检验专用章） 2026 年 5 月 6 日		
检测检验组成员		李若胜、赵艳川		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 4 月 13 日		

批准：胡春林　　审核：饶伟元　　主检：李若胜

日期：2026.5.6　　日期：2026.5.6　　日期：2026.5.6

仅用于项目公示使用

4 必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	   
相关图表	通风系统检测点位布置图见附件
