云南高华安全生产检测检验有限公司
10月检测检验项目公示表

记录编号：Q合格YNGH—ZL51—2026　　No：202610

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	四川发展天瑞矿业有限公司	11.通风系统	Q/YNGH-RE11-26057	乔松伟	杨锦松	2026/10/10	2026/11/2	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE11-26057

金属非金属地下矿山通风系统

检测鉴定报告

委 托 单 位：四川发展天瑞矿业有限公司

受 检 单 位：四川省马边老河坝磷矿铜厂埂(八号矿块)磷矿

项 目 名 称：八号矿块磷矿通风系统检测鉴定

检测检验地点：八号矿块磷矿矿井系统

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 10 日-13 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属地下矿山通风系统检测鉴定报告

报告编号：Q/YNGH-RE11-26057　　共 50 页　第 1 页

委托单位	名称	四川发展天瑞矿业有限公司		
	地址	四川省乐山市马边彝族自治县		
项目名称		八号矿块磷矿通风系统检测鉴定		
生产规模		250 万吨/年	主通风机数量（台）	2
检测项目状态		矿井处于正常生产状态，现场检测时主通风机正常运行		
检测检验地点		八号矿块磷矿矿井系统	检测检验日期	2026 年 10 月 10 日-13 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	四川省马边老河坝磷矿铜厂埂(八号矿块)磷矿		
	地址	四川省乐山市马边彝族自治县烟峰镇		
检测鉴定项目		1、矿井通风系统风量测定、风压测定、风机工况、空气质量检测； 2、风量（风速）合格率、风源风质合格率、作业场所空气质量合格率、有效风量率、风机效率、风量供需比、综合指标。		
检测鉴定依据		1、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 2、KA 30-2026《金属非金属地下矿山通风技术规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测鉴定结论		依据以上标准规范要求，对该矿通风系统进行了检测鉴定，结果详见第 3 章“检测检验项目”。 **综合判定：**该矿通风系统综合指标合格 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 17 日		
检测检验组成员		乔松伟、杨锦松		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 9 日		

批准：胡春林　　审核：[illegible]　　主检：乔松伟

日期：2026.10.17　　日期：2026.10.17　　日期：2026.10.17


仅用于项目公示使用

4 必要的图表、图片

<table>
<tr><td>设备照片</td><td>


</td></tr>
<tr><td>现场检测照片</td><td>



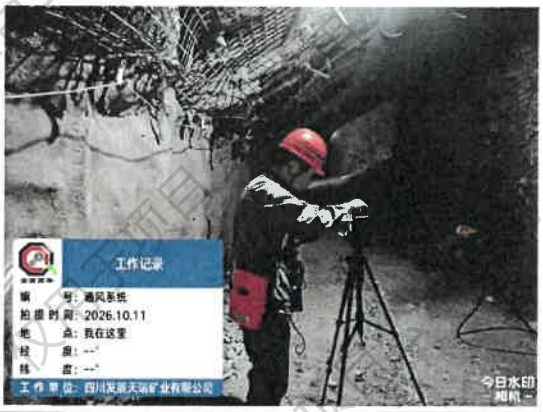


</td></tr>
<tr><td>相关图表</td><td>通风系统检测点位布置图见附件</td></tr>
</table>
