云南高华安全生产检测检验有限公司
10月检测检验项目公示表

记录编号：Q合格YNGH—ZL51—2026　　No：202610

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	文山中泰锰业有限公司	01.固定式空气压缩机	Q/YNGH-RE01-26121	乔松伟	赵艳川	2026/6/13	2026/8/3	合格
2	文山中泰锰业有限公司	08.1.钢丝绳	Q/YNGH-RE8.1-26201	卢昆	杨雄鑫	2026/10/21	2026/10/23	合格
3	文山中泰锰业有限公司	10.主通风机	Q/YNGH-RE10-26110	饶佛元	李若胜	2026/10/14	2026/10/30	合格
4	文山中泰锰业有限公司	11.通风系统	Q/YNGH-RE11-26056	饶佛元	李若胜	2026/10/14	2026/10/30	合格
5	文山中泰锰业有限公司	12.主排水泵、排水系统	Q/YNGH-RE12-26052	李若胜	饶佛元	2026/10/14	2026/10/30	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE01-26121

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位：文山中泰锰业有限公司

受 检 单 位：文山中泰锰业有限公司老乌锰矿

设 备 名 称：单螺杆空气压缩机

型 号 规 格：FHOG-D75F

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 6 月 13 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE01-26121　　共 11 页　第 1 页

委托单位	名称	文山中泰锰业有限公司		
	地址	云南省文山州文山市马塘镇工业园区		
设备名称		单螺杆空气压缩机	设备编号	20100269（出厂编号）
型号规格		FHOG-D75F	出厂日期	2010 年 2 月
制造单位		上海飞和实业集团有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		老乌锰矿一号井口空压机房	检测检验日期	2026 年 6 月 13 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	文山中泰锰业有限公司老乌锰矿		
	地址	云南省文山州文山市德厚镇湖海村		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 1 部分：固定式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论		合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜4	C 类不合格项＜7	B+C 类不合格项＜7
		检测结果	0	0	1	1
		综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 7 月 1 日				
检测检验组成员		赵艳川、乔松伟				
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 6 月 12 日				

批准：　　审核：　　主检：赵艳川

日期：2026.7.1　　日期：2026.7.1　　日期：2026.7.1

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26201

金属非金属矿山提升钢丝绳

安全检测检验报告

委 托 单 位：	文山中泰锰业有限公司
受 检 单 位：	文山中泰锰业有限公司老乌锰矿
设 备 名 称：	天然芯光面钢丝绳
型 号 规 格：	26.0　6×19S+NFC　1770
安 装 地 点：	老乌锰矿绞车
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 21 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

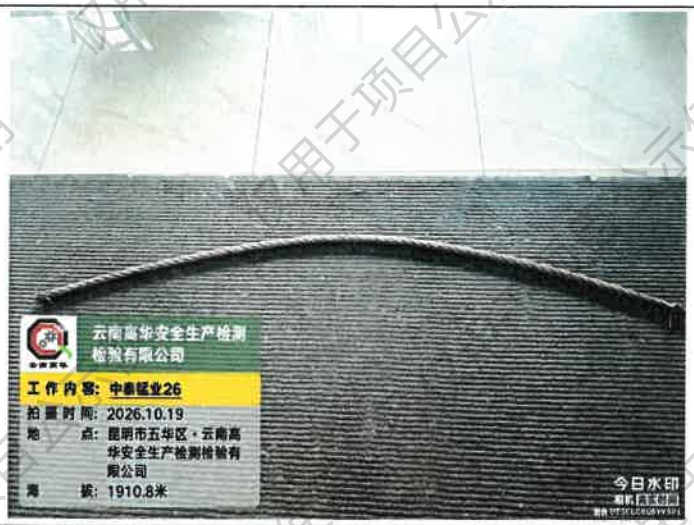
金属非金属矿山在用提升钢丝绳安全检测检验报告

委托单位	名称	文山中泰锰业有限公司		
	地址	云南省文山壮族苗族自治州文山市马塘镇工业园区		
样品名称		天然芯光面钢丝绳	样品编号	GSLL-2610-23
型号规格		26.0　6×19S+NFC　1770	收样时间	2026 年 10 月 14 日
制造单位		贵州钢绳股份有限公司		
样品状态		在用绳		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司力学实验室	检测检验日期	2026 年 10 月 21 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	文山中泰锰业有限公司老乌锰矿		
	地址	云南省文山壮族苗族自治州文山市德厚镇湖海村		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB 8918-2006《重要用途钢丝绳》 GB 33955-2024《矿井提升用钢丝绳》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		经检验，所检项目符合 AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》中提升或其他用途钢丝绳检验的技术要求。 **综合判定：** 合格☑　不合格☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 23 日		
检测检验组成员		卢昆、王丽花		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 4 月 20 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.23　　日期：2026.10.23.　　日期：2026.10.23

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE10-26110

金属非金属矿山在用主通风机系统

安全检测检验报告

委 托 单 位：文山中泰锰业有限公司

受 检 单 位：文山中泰锰业有限公司老乌锰矿

设 备 名 称：矿用节能风机

型 号 规 格：K40-4

检测检验地点：2#斜井井口

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 14 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用主通风机系统安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE10-26110　　共 9 页　第 1 页

委托单位	名称	文山中泰锰业有限公司		
	地址	云南省文山壮族苗族自治州文山市德厚镇		
设备名称		矿用节能风机	设备编号	8664
型号规格		K40-4	出厂日期	2019 年 3 月
制造单位		淄博运通通风设备有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		2#斜井井口	检测检验日期	2026 年 10 月 14 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	文山中泰锰业有限公司老乌锰矿		
	地址	云南省文山壮族苗族自治州文山市德厚镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》 GB 16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论

合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜3	C 类不合格项＜5	B+C 类不合格项＜5
检测结果	0	1	1	2

综合判定：合格

（检测检验专用章）

2026 年 10 月 27 日

检测检验组成员	饶佛元、李若胜
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 13 日

批准：胡春林　日期：2026.10.29

审核：[illegible]　日期：2026.10.29

主检：饶佛元　日期：2026.10.27

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	 
相关图表	/

本页以下空白

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE11-26056

金属非金属地下矿山通风系统

检测鉴定报告

委 托 单 位：文山中泰锰业有限公司

受 检 单 位：文山中泰锰业有限公司老乌锰矿

项 目 名 称：老乌锰矿通风系统检测鉴定

检测检验地点：老乌锰矿矿井系统

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 14 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属地下矿山通风系统检测鉴定报告

报告编号：Q/YNGH-RE11-26056　　共 31 页　第 1 页

委托单位	名称	文山中泰锰业有限公司		
	地址	云南省文山壮族苗族自治州文山市德厚镇		
项目名称		老乌锰矿通风系统检测鉴定		
生产规模		3 万吨/年	主通风机数量（台）	1
检测项目状态		矿井处于停产状态，现场检测时主通风机正常运行		
检测检验地点		老乌锰矿矿井系统	检测检验日期	2026 年 10 月 14 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	文山中泰锰业有限公司老乌锰矿		
	地址	云南省文山壮族苗族自治州文山市德厚镇		
检测鉴定项目		1、矿井通风系统风量测定、风压测定、风机工况、空气质量检测； 2、风量（风速）合格率、风源风质合格率、作业场所空气质量合格率、有效风量率、风机效率、风量供需比、综合指标。		
检测鉴定依据		1、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 2、KA 30-2026《金属非金属地下矿山通风技术规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测鉴定结论		依据以上标准规范要求，对该矿通风系统进行了检测鉴定，结果详见第 3 章“检测检验项目”。 **综合判定：**该矿通风系统综合指标合格 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 29 日		
检测检验组成员		饶佛元、李若胜		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 13 日		

批准：胡春林　　审核：[illegible]　　主检：饶佛元

日期：2026.10.29　　日期：2026.10.29　　日期：2026.10.29

仅用于项目公示使用

4 必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	 
相关图表	通风系统检测点位布置图见附件

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE12-26052

金属非金属地下矿山主排水系统

安全检测检验报告

委 托 单 位：文山中泰锰业有限公司

受 检 单 位：文山中泰锰业有限公司老乌锰矿

设 备 名 称：多级泵

型 号 规 格：D46-50×6

检测检验地点：1427 水泵房

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 14 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属地下矿山主排水系统安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE12-26052　　共 14 页　第 1 页

委托单位	名称	文山中泰锰业有限公司		
	地址	云南省文山壮族苗族自治州文山市德厚镇		
设备名称		多级泵	设备编号	1#、2#、3#
型号规格		D46-50×6	出厂日期	详见参数表
制造单位		河北星泰泵业有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1427 水泵房	检测检验日期	2026 年 10 月 14 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	文山中泰锰业有限公司老乌锰矿		
	地址	云南省文山壮族苗族自治州文山市德厚镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论		1. 单台排水泵检验结论。 1#水泵不合格项：A 类项目 0 项、B 类项目 0 项、C 类项目 1 项、B+C 类项目之和 1 项；2#水泵不合格项：A 类项目 0 项、B 类项目 0 项、C 类项目 1 项、B+C 类项目之和 1 项；3#水泵不合格项：A 类项目 0 项、B 类项目 0 项、C 类项目 1 项、B+C 类项目之和 1 项。 2. 主排水系统检验结论。该排水系统中，构成排水系统的排水泵的不合格台数占总台数的 0 台；主排水系统检验项均合格。 综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 21 日		
检测检验组成员		李若胜、饶佛元		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 13 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.21　　日期：2026.10.21　　日期：2026.10.21

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	 
相关图表	/
