云南高华安全生产检测检验有限公司
10月检测检验项目公示表

记录编号：Q合格YNGH—ZL51—2026　　No：202610

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	云南锡业股份有限公司卡房分公司	11.通风系统	Q/YNGH-RE11-26040	胡春林	饶佛元	2026/8/4	2026/9/30	合格
2	云南锡业股份有限公司卡房分公司		Q/YNGH-RE11-26054	胡春林	饶佛元	2026/8/4	2026/10/26	合格
3	云南锡业股份有限公司卡房分公司		Q/YNGH-RE11-26055	胡春林	饶佛元	2026/8/4	2026/10/26	合格
4	云南锡业股份有限公司卡房分公司	05.缠绕式矿井提升机	Q/YNGH-RE05-26036	饶佛元	胡春林	2026/9/29	2026/10/16	合格
5	云南锡业股份有限公司卡房分公司	08.1.钢丝绳	Q/YNGH-RE8.1-26186	赵艳川	卢昆	2026/10/15	2026/10/16	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE11-26040

金属非金属地下矿山通风系统

检测鉴定报告

委 托 单 位：云南锡业股份有限公司卡房分公司

受 检 单 位：云南锡业股份有限公司卡房分公司

项 目 名 称：卡房分公司通风系统检测鉴定

检测检验地点：卡房分公司金竹林坑、东瓜林坑开采系统

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 8 月 4-20 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属地下矿山通风系统检测鉴定报告

报告编号：Q/YNGH-RE11-26040　　共 87 页　第 1 页

委托单位	名称	云南锡业股份有限公司卡房分公司		
	地址	云南省红河州个旧市卡房镇		
项目名称		卡房分公司通风系统检测鉴定		
生产规模		196.5 万吨/年	主通风机数量（台）	14
检测项目状态		矿井处于停产整改状态，现场检测时检测区域主通风机正常运行		
检测检验地点		卡房分公司金竹林坑、东瓜林坑开采系统	检测检验日期	2026 年 8 月 4-20 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	云南锡业股份有限公司卡房分公司		
	地址	云南省红河州个旧市卡房镇		
检测鉴定项目		1、矿井通风系统风量测定、风压测定、风机工况、空气质量检测； 2、风量（风速）合格率、风源风质合格率、作业场所空气质量合格率、有效风量率、风机效率、风量供需比、综合指标。		
检测鉴定依据		1、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 2、KA 30-2026《金属非金属地下矿山通风技术规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测鉴定结论		依据以上标准规范要求，对该矿通风系统进行了检测鉴定，结果详见第 3 章“检测检验项目”。 **综合判定：**该矿通风系统综合指标合格 （检测检验专用章） 2026 年 9 月 11 日		
检测检验组成员		胡春林、饶佛元、杨锦松、吴邦达		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 8 月 3 日		

批准：[illegible]　审核：[illegible]　主检：[illegible]

日期：2026.9.11　日期：2026.9.11　日期：2026.9.11

仅用于项目公示使用

4 必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	   
相关图表	

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE11-26054

金属非金属地下矿山通风系统

检测鉴定报告

委 托 单 位：云南锡业股份有限公司卡房分公司

受 检 单 位：云南锡业股份有限公司卡房分公司

项 目 名 称：卡房分公司竹林矿段通风系统检测鉴定

检测检验地点：卡房分公司金竹林坑开采系统

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 8 月 4-20 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属地下矿山通风系统检测鉴定报告

报告编号：Q/YNGH-RE11-26054　　共 58 页　第 1 页

委托单位	名称	云南锡业股份有限公司卡房分公司		
	地址	云南省红河州个旧市卡房镇		
项目名称		卡房分公司竹林矿段通风系统检测鉴定		
生产规模		30 万吨/年	主通风机数量（台）	6
检测项目状态		矿井处于停产状态，现场检测时检测区域主通风机正常运行		
检测检验地点		卡房分公司金竹林坑开采系统	检测检验日期	2026 年 8 月 4-20 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	云南锡业股份有限公司卡房分公司		
	地址	云南省红河州个旧市卡房镇		
检测鉴定项目		1、矿井通风系统风量测定、风压测定、风机工况、空气质量检测； 2、风量（风速）合格率、风源风质合格率、作业场所空气质量合格率、有效风量率、风机效率、风量供需比、综合指标。		
检测鉴定依据		1、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 2、KA 30-2026《金属非金属地下矿山通风技术规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测鉴定结论		依据以上标准规范要求，对该矿通风系统进行了检测鉴定，结果详见第 3 章“检测检验项目”。 **综合判定：**该矿通风系统综合指标合格。 （检测检验专用章） 2026 年 9 月 11 日		
检测检验组成员		胡春林、饶佛元、吴邦达		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 8 月 3 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.9.11　　日期：2026.9.11　　日期：2026.9.11

仅用于项目公示使用

4 必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	   
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE11-26055

金属非金属地下矿山通风系统

检测鉴定报告

委 托 单 位：云南锡业股份有限公司卡房分公司

受 检 单 位：云南锡业股份有限公司卡房分公司

项 目 名 称：卡房分公司新山矿段通风系统检测鉴定

检测检验地点：卡房分公司东瓜林坑开采系统

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 8 月 4-20 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属地下矿山通风系统检测鉴定报告

报告编号：Q/YNGH-RE11-26055　　共 58 页　第 1 页

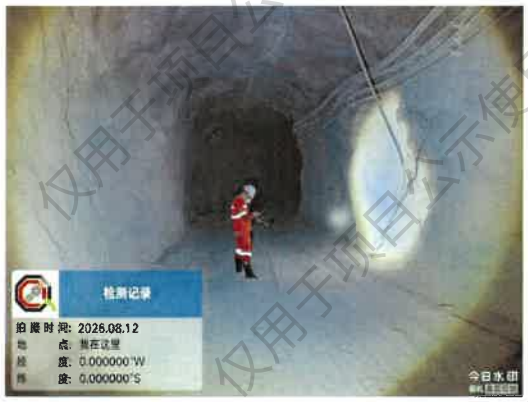
委托单位	名称	云南锡业股份有限公司卡房分公司		
	地址	云南省红河州个旧市卡房镇		
项目名称		卡房分公司新山矿段通风系统检测鉴定		
生产规模		150 万吨/年	主通风机数量（台）	7
检测项目状态		矿井处于停产整改状态，现场检测时检测区域主通风机正常运行		
检测检验地点		卡房分公司东瓜林坑开采系统	检测检验日期	2026 年 8 月 4-20 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	云南锡业股份有限公司卡房分公司		
	地址	云南省红河州个旧市卡房镇		
检测鉴定项目		1、矿井通风系统风量测定、风压测定、风机工况、空气质量检测； 2、风量（风速）合格率、风源风质合格率、作业场所空气质量合格率、有效风量率、风机效率、风量供需比、综合指标。		
检测鉴定依据		1、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 2、KA 30-2026《金属非金属地下矿山通风技术规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测鉴定结论		依据以上标准规范要求，对该矿通风系统进行了检测鉴定，结果详见第 3 章“检测检验项目”。 **综合判定：**该矿通风系统综合指标合格 （检测检验专用章） 2026 年 9 月 11 日		
检测检验组成员		胡春林、饶佛元、杨锦松		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 8 月 3 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.9.11　　日期：2026.9.11　　日期：2026.9.11

仅用于项目公示使用

4 必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	   
相关图表	

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE05-26036

金属非金属矿山在用缠绕式提升机

安全检测检验报告

委 托 单 位：云南锡业股份有限公司卡房分公司

受 检 单 位：云南锡业股份有限公司卡房分公司

设 备 名 称：缠绕式提升机

型 号 规 格：JK-3×2.2P

检测检验地点：1800 中段南部提升机硐室

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 9 月 29 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用缠绕式提升机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH—RE05—26036　　共 22 页　第 1 页

委托单位	名称	云南锡业股份有限公司卡房分公司		
	地址	云南省红河州个旧市卡房镇		
设备名称		缠绕式提升机	设备编号	19113
型号规格		JK-3×2.2P	出厂日期	2019 年 10 月
制造单位		中信重工机械股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1800 中段南部提升机硐室	检测检验日期	2026 年 9 月 29 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	3 年
受检单位	名称	云南锡业股份有限公司卡房分公司		
	地址	云南省红河州个旧市卡房镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ2020-2008《金属非金属矿山在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论		项目类型 / 合格条件 / 检测结果		

项目类型	A 类不合格	B 类不合格	C 类不合格	B+C 类不合格
合格条件	<1	<4	<7	<8
检测结果	0	1	0	1

综合判定：合格

（检测检验专用章）

2026 年 10 月 16 日

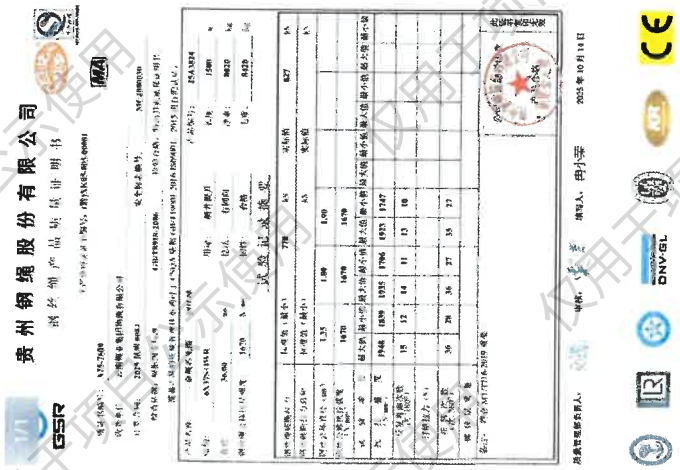
检测检验组成员	饶佛元、胡春林
备注	本报告有效期 3 年，有效期至 2029 年 9 月 28 日

批准：　　审核：　　主检：饶佛元

日期：2026.10.16　　日期：2026.10.16　　日期：2026.10.16

仅用于项目公示使用

六、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测检验照片	
相关图表	

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26186

金属非金属矿山提升钢丝绳

安全检测检验报告

委 托 单 位：	云南锡业股份有限公司卡房分公司
受 检 单 位：	云南锡业股份有限公司卡房分公司
设 备 名 称：	金属芯光面钢丝绳
型 号 规 格：	36.0　6×37S+IWR　1670
安 装 地 点：	1800 中段南部箕斗井
检测检验类别：	悬挂前检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 15 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5391002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用提升钢丝绳安全检测检验报告

委托单位	名称	云南锡业股份有限公司卡房分公司		
	地址	云南省红河州个旧市卡房镇		
样品名称		金属芯光面钢丝绳	样品编号	GSLL-2609-33
型号规格		36.0　6×37S+IWR　1670	收样时间	2026 年 9 月 30 日
制造单位		贵州钢绳股份有限公司		
样品状态		新钢丝绳		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司力学实验室	检测检验日期	2026 年 10 月 15 日
检测检验类别		悬挂前检测检验	检测检验周期	12 个月
受检单位	名称	云南锡业股份有限公司卡房分公司		
	地址	云南省红河州个旧市卡房镇		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB 8918-2006《重要用途钢丝绳》 GB 33955-2024《矿井提升用钢丝绳》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		经检验，所检项目符合 AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》中提升或其他用途钢丝绳检验的技术要求。 **综合判定：**合格☑　不合格☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 16 日		
检测检验组成员		卢昆、赵艳川		
备注		本报告有效期 12 个月，有效期至 2027 年 10 月 14 日		

批准：　　审核：王丽云　　主检：赵艳川

日期：2026.10.16　　日期：2026.10.16　　日期：2026.10.16

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	  
相关图表	
