云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026　　No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	沧源县云矿金腊资源有限公司	02.移动式空气压缩机	Q/YNGH-RE02-26004	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/4/29	合格
2	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE02-26005	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/4/29	合格
3	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE02-26006	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/4/29	合格
4	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE02-26007	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/4/29	合格
5	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE02-26008	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/4/29	合格
6	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE02-26009	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/4/29	合格
7	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE02-26010	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/4/29	合格
8	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE02-26011	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/4/29	合格
9	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE02-26012	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/4/29	合格
10	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE02-26013	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/4/29	合格
11	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE02-26014	李若胜	王宇	2026/4/1	2026/4/29	合格
12	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE02-26015	李若胜	王宇	2026/4/1	2026/4/29	合格
13	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE02-26016	李若胜	王宇	2026/4/1	2026/4/29	合格
14	沧源县云矿金腊资源有限公司	10.主通风机	Q/YNGH-RE10-26028	饶佛元	胡春林	2026/3/31	2026/4/29	合格
15	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE10-26029	饶佛元	胡春林	2026/4/1	2026/4/29	合格
16	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE10-26030	胡春林	饶佛元	2026/3/31	2026/4/29	合格
17	沧源县云矿金腊资源有限公司	11.通风系统	Q/YNGH-RE11-26014	饶佛元	胡春林	2026/3/31	2026/4/29	合格
18	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE11-26015	饶佛元	胡春林	2026/4/1	2026/4/29	合格
19	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE11-26016	胡春林	饶佛元	2026/3/31	2026/4/29	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026　　No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
20	沧源县云矿金腊资源有限公司	15.电力变压器	Q/YNGH-RE15-26011	王宇	李若胜	2026/3/31	2026/4/29	合格
21	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE15-26012	王宇	李若胜	2026/3/31	2026/4/29	合格
22	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE15-26013	王宇	李若胜	2026/4/1	2026/4/29	合格
23	沧源县云矿金腊资源有限公司	24.1.监测监控系统	Q/YNGH-RE24.1-26002	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/4/29	合格
24	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE24.1-26003	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/4/29	合格
25	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE24.1-26004	李若胜	王宇	2026/4/1	2026/4/29	合格
26	沧源县云矿金腊资源有限公司	24.2.人员定位系统	Q/YNGH-RE24.2-26002	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/4/29	合格
27	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE24.2-26003	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/4/29	合格
28	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE24.2-26004	李若胜	王宇	2026/4/1	2026/4/29	合格
29	沧源县云矿金腊资源有限公司	24.3.通信联络系统	Q/YNGH-RE24.3-26002	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/5/25	合格
30	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE24.3-26003	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/5/25	合格
31	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE24.3-26004	李若胜	王宇	2026/4/1	2026/5/25	合格
32	沧源县云矿金腊资源有限公司	26.局部通风机	Q/YNGH-RE26-26001	李若胜	饶佛元	2026/3/31	2026/4/29	合格
33	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE26-26002	李若胜	饶佛元	2026/3/31	2026/4/29	合格
34	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE26-26003	李若胜	饶佛元	2026/3/31	2026/4/29	合格
35	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE26-26004	李若胜	饶佛元	2026/3/31	2026/4/29	合格
36	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE26-26005	李若胜	饶佛元	2026/3/31	2026/4/29	合格
37	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE26-26006	李若胜	饶佛元	2026/3/31	2026/4/29	合格
38	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE26-26007	李若胜	饶佛元	2026/4/1	2026/4/29	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026　　No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
39	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE26-26008	李若胜	饶佛元	2026/4/1	2026/4/29	合格
40	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE26-26009	李若胜	饶佛元	2026/4/1	2026/4/29	合格
41	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE26-26011	李若胜	饶佛元	2026/4/1	2026/4/29	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE02-26004

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

受 检 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司（老厂矿区）

设 备 名 称：开山牌螺杆空气压缩机

型 号 规 格：LGY-5/8

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 3 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE02-26004　　共 10 页　第 1 页

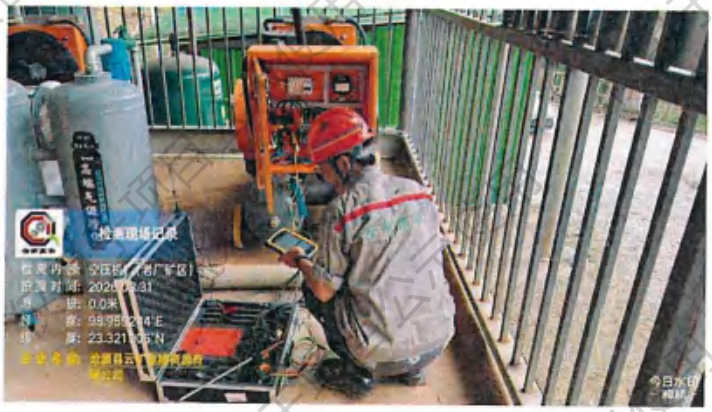
委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
设备名称		开山牌螺杆空气压缩机	设备编号	1#
型号规格		LGY-5/8	出厂日期	2024 年 3 月
制造单位		浙江开山压缩机有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		老厂矿区空压机房	检测检验日期	2026 年 3 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（老厂矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2056-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 2 部分：移动式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论					
	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜3	C 类不合格项＜6	B+C 类不合格项＜6
	检测结果	0	1	1	2
	综合判定：合格				
	（检测检验专用章） 2026 年 4 月 22 日				
检测检验组成员	李若胜、王宇				
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 30 日				

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE02-26005

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

受 检 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司（老厂矿区）

设 备 名 称：开山牌螺杆空气压缩机

型 号 规 格：LGY-5/8

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 3 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE02-26005　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
设备名称		开山牌螺杆空气压缩机	设备编号	2#
型号规格		LGY-5/8	出厂日期	2024 年 3 月
制造单位		浙江开山压缩机有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		老厂矿区空压机房	检测检验日期	2026 年 3 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（老厂矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2056-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 2 部分：移动式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论					
	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜3	C 类不合格项＜6	B+C 类不合格项＜6
	检测结果	0	1	1	2
	综合判定：合格				
	（检测检验专用章） 2026 年 4 月 22 日				
检测检验组成员	李若胜、王宇				
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 30 日				

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE02-26006

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

受 检 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司（老厂矿区）

设 备 名 称：开山牌螺杆空气压缩机

型 号 规 格：LGY-5/8GT

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 3 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE02-26006　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
设备名称		开山牌螺杆空气压缩机	设备编号	3#
型号规格		LGY-5/8GT	出厂日期	2024 年 9 月
制造单位		浙江开山压缩机有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		老厂矿区空压机房	检测检验日期	2026 年 3 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（老厂矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2056-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 2 部分：移动式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论

合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜3	C 类不合格项＜6	B+C 类不合格项＜6
检测结果	0	1	1	2

综合判定：合格

（检测检验专用章）

2026 年 4 月 22 日

检测检验组成员	李若胜、王宇
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 30 日

批准：　日期：2026.4.22

审核：　日期：2026.4.22

主检：　日期：2026.4.22

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE02-26007

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

受 检 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司（金腊矿区）

设 备 名 称：开山牌螺杆空气压缩机

型 号 规 格：LGY-5/8

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 3 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5201002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE02-26007　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
设备名称		开山牌螺杆空气压缩机	设备编号	1#
型号规格		LGY-5/8	出厂日期	2022 年 10 月
制造单位		浙江开山压缩机有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		金腊矿区空压机房	检测检验日期	2026 年 3 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（金腊矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2056-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 2 部分：移动式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论		合格条件	A 类不合格项<1	B 类不合格项<3	C 类不合格项<6	B+C 类不合格项<6
		检测结果	0	1	2	3
		综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 22 日				
检测检验组成员		李若胜、王宇				
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 30 日				

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE02-26008

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

受 检 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司（金腊矿区）

设 备 名 称：开山牌螺杆空气压缩机

型 号 规 格：LGY-5/8GT

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 3 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE02-26008　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
设备名称		开山牌螺杆空气压缩机	设备编号	2#
型号规格		LGY-5/8GT	出厂日期	2026 年 3 月
制造单位		浙江开山压缩机有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		金腊矿区空压机房	检测检验日期	2026 年 3 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（金腊矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2056-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 2 部分：移动式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论					
	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜3	C 类不合格项＜6	B+C 类不合格项＜6
	检测结果	0	1	1	2
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 22 日				
检测检验组成员	李若胜、王宇				
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 30 日				

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE02-26009

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

受 检 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司（金腊矿区）

设 备 名 称：开山牌螺杆空气压缩机

型 号 规 格：LGY-5/8GT

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 3 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE02-26009　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
设备名称		开山牌螺杆空气压缩机	设备编号	3#
型号规格		LGY-5/8GT	出厂日期	2026 年 1 月
制造单位		浙江开山压缩机有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		金腊矿区空压机房	检测检验日期	2026 年 3 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（金腊矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2056-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 2 部分：移动式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论		合格条件：A 类不合格项＜1；B 类不合格项＜3；C 类不合格项＜6；B+C 类不合格项＜6 检测结果：0；1；1；2 **综合判定：**合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 22 日		
检测检验组成员		李若胜、王宇		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 30 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE02-26010

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

受 检 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司（金腊矿区）

设 备 名 称：开山牌螺杆压缩机

型 号 规 格：LGY-5/8

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 3 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE02-26010　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
设备名称		开山牌螺杆压缩机	设备编号	4#
型号规格		LGY-5/8	出厂日期	2018 年 12 月
制造单位		浙江开山压缩机股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		金腊矿区空压机房	检测检验日期	2026 年 3 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（金腊矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2056-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 2 部分：移动式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜3	C 类不合格项＜6	B+C 类不合格项＜6
	检测结果	0	1	1	2
	综合判定：合格				
检测检验组成员	李若胜、王宇				
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 30 日				

（检测检验专用章）

2026 年 4 月 22 日

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE02-26011

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

受 检 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司（金腊矿区）

设 备 名 称：开山牌螺杆压缩机

型 号 规 格：LGY-5/8

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 3 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE02-26011　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
设备名称		开山牌螺杆压缩机	设备编号	5#
型号规格		LGY-5/8	出厂日期	2018 年 9 月
制造单位		浙江开山压缩机股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		金腊矿区空压机房	检测检验日期	2026 年 3 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（金腊矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2056-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 2 部分：移动式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论					
	合格条件	A 类不合格项<1	B 类不合格项<3	C 类不合格项<6	B+C 类不合格项<6
	检测结果	0	1	1	2
	综合判定：合格				
	（检测检验专用章） 2026 年 4 月 22 日				
检测检验组成员	李若胜、王宇				
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 30 日				

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE02-26012

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位：	沧源县云矿金腊资源有限公司
受 检 单 位：	沧源县云矿金腊资源有限公司（金腊矿区）
设 备 名 称：	螺杆式空气压缩机
型 号 规 格：	LGY-4.6/6
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 3 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE02-26012　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
设备名称		螺杆式空气压缩机	设备编号	6#
型号规格		LGY-4.6/6	出厂日期	2012 年 10 月
制造单位		维尔泰克（上海）压缩空气系统技术有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		金腊矿区空压机房	检测检验日期	2026 年 3 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（金腊矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2056-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 2 部分：移动式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜3	C 类不合格项＜6	B+C 类不合格项＜6
	检测结果	0	1	2	3
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 22 日				
检测检验组成员		李若胜、王宇			
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 30 日			

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22　　日期：2026-4-22

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE02-26013

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

受 检 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司（金腊矿区）

设 备 名 称：开山牌螺杆压缩机

型 号 规 格：LGY-5/8

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 3 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE02-26013　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
设备名称		开山牌螺杆压缩机	设备编号	7#
型号规格		LGY-5/8	出厂日期	2017 年
制造单位		浙江开山压缩机股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		金腊矿区空压机房	检测检验日期	2026 年 3 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（金腊矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2056-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 2 部分：移动式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论					
	合格条件	A 类不合格项<1	B 类不合格项<3	C 类不合格项<6	B+C 类不合格项<6
	检测结果	0	1	2	3
	综合判定：合格				
	（检测检验专用章） 2026 年 4 月 22 日				

检测检验组成员	李若胜、王宇
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 30 日

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE02-26014

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位：	沧源县云矿金腊资源有限公司
受 检 单 位：	沧源县云矿金腊资源有限公司（芒哈矿区）
设 备 名 称：	开山牌螺杆压缩机
型 号 规 格：	LGY-5/8
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 4 月 1 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE02-26014　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
设备名称		开山牌螺杆压缩机	设备编号	1#
型号规格		LGY-5/8	出厂日期	/
制造单位		浙江开山压缩机股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		芒哈矿区空压机房	检测检验日期	2026 年 4 月 1 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（芒哈矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2056-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 2 部分：移动式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论	合格条件	A 类不合格项<1	B 类不合格项<3	C 类不合格项<6	B+C 类不合格项<6
	检测结果	0	1	1	2
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 22 日				
检测检验组成员		李若胜、王宇			
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 31 日			

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE02-26015

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位：	沧源县云矿金腊资源有限公司
受 检 单 位：	沧源县云矿金腊资源有限公司（芒哈矿区）
设 备 名 称：	螺杆式空气压缩机
型 号 规 格：	LGY-5/8GT
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 4 月 1 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207018

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE02-26015　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
设备名称		螺杆式空气压缩机	设备编号	2#
型号规格		LGY-5/8GT	出厂日期	2026 年 3 月
制造单位		浙江开山压缩机有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		芒哈矿区空压机房	检测检验日期	2026 年 4 月 1 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（芒哈矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）；		
检测检验依据		AQ 2056-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 2 部分：移动式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论					
	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜3	C 类不合格项＜6	B+C 类不合格项＜6
	检测结果	0	1	1	2
	综合判定：合格				
	（检测检验专用章） 2026 年 4 月 22 日				
检测检验组成员	李若胜、王宇				
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 31 日				

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE02-26016

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

受 检 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司（芒哈矿区）

设 备 名 称：螺杆式空气压缩机

型 号 规 格：LGY-5/8GT

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 4 月 1 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE02-26016　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
设备名称		螺杆式空气压缩机	设备编号	3#
型号规格		LGY-5/8GT	出厂日期	2026 年 3 月
制造单位		浙江开山压缩机有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		芒哈矿区空压机房	检测检验日期	2026 年 4 月 1 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（芒哈矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2056-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第2部分：移动式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论	合格条件	A 类不合格项<1	B 类不合格项<3	C 类不合格项<6	B+C 类不合格项<6
	检测结果	0	1	1	2
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 22 日				
检测检验组成员		李若胜、王宇			
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 31 日			

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE10-26028

金属非金属矿山在用主通风机系统

安全检测检验报告

委 托 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

受 检 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司（老厂矿区）

设 备 名 称：矿井轴流通风机

型 号 规 格：FKZNo11/30

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 3 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用主通风机系统安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE10-26028　　共 9 页　第 1 页

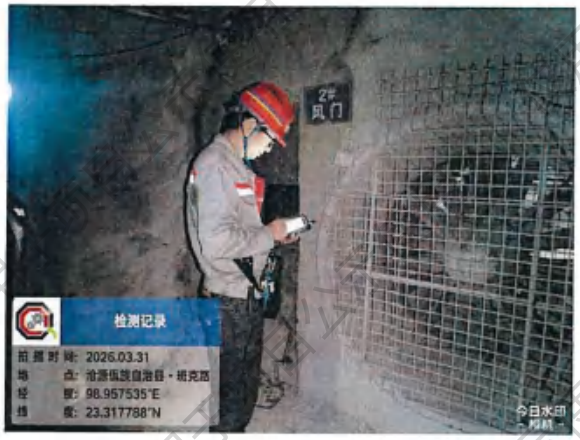
委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
设备名称		矿井轴流通风机	设备编号	202303189
型号规格		FKZNo11/30	出厂日期	2023 年 12 月
制造单位		湖南科祥防爆风机有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1250 中段回风巷	检测检验日期	2026 年 3 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（老厂矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》 GB 16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		

检测检验结论					
	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜3	C 类不合格项＜5	B+C 类不合格项＜5
	检测结果	0	0	0	0
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 24 日				
检测检验组成员	饶佛元、胡春林				
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 30 日				

批准：　　审核：　　主检：饶佛元

日期：2026.4.24　　日期：2026.4.24　　日期：2026.4.24

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE10-26029

金属非金属矿山在用主通风机系统

安全检测检验报告

委 托 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

受 检 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司（芒哈矿区）

设 备 名 称：矿用隔爆型主扇轴流通风机

型 号 规 格：K40-4-No/11

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 4 月 1 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

云南高华安全生产检测检验有限公司 检测检验专用章 5301002207018

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用主通风机系统安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE10-26029　　

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
设备名称		矿用隔爆型主扇轴流通风机	设备编号	202201566
型号规格		K40-4-No/11	出厂日期	2022 年 6 月
制造单位		上海科祥防爆机电有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1090 中段进风巷	检测检验日期	2026 年 4 月 1 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（芒哈矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》 GB 16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		

检测检验结论

合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜3	C 类不合格项＜5	B+C 类不合格项＜5
检测结果	0	0	0	0

综合判定：合格

（检测检验专用章）

2026 年 4 月 24 日

检测检验组成员	饶佛元、胡春林
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 31 日

批准：　日期：2026.4.24

审核：　日期：2026.4.24

主检：饶佛元　日期：2026.4.24

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE10-26030

金属非金属矿山在用主通风机系统

安全检测检验报告

委 托 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

受 检 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司（金腊矿区）

设 备 名 称：矿用隔爆型地面抽出式轴流通风机

型 号 规 格：FBCZ-13

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 3 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用主通风机系统安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE10-26030　　共 9 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
设备名称		矿用隔爆型地面抽出式轴流通风机	设备编号	/
型号规格		FBCZ-13	出厂日期	2022 年 11 月
制造单位		上海科祥防爆机电有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1530 中段回风巷	检测检验日期	2026 年 3 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（金腊矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》 GB 16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		

检测检验结论					
	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜3	C 类不合格项＜5	B+C 类不合格项＜5
	检测结果	0	0	0	0
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 24 日				

检测检验组成员	饶佛元、胡春林
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 30 日

批准：　　审核：　　主检：饶佛元

日期：2026.4.24　　日期：2026.4.24　　日期：2026.4.24

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE11-26014

金属非金属地下矿山通风系统

检测鉴定报告

委 托 单 位：	沧源县云矿金腊资源有限公司
受 检 单 位：	沧源县云矿金腊资源有限公司沧源县老厂铅锌矿
项 目 名 称：	老厂铅锌矿通风系统检测鉴定
检测检验地点：	老厂铅锌矿矿井系统
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 3 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属地下矿山通风系统检测鉴定报告

报告编号：Q/YNGH-RE11-26014　　共 30 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
项目名称		老厂铅锌矿通风系统检测鉴定		
生产规模		3 万吨/年	主通风机数量（台）	1
检测项目状态		矿井处于正常生产状态，现场检测时主通风机正常运行		
检测检验地点		老厂铅锌矿矿井系统	检测检验日期	2026 年 3 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司沧源县老厂铅锌矿		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测鉴定项目		风量（风速）合格率、风源风质合格率、作业场所空气质量合格率、有效风量率、风机效率、风量供需比、综合指标。		
检测鉴定依据		1、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 2、KA 30-2026《金属非金属地下矿山通风技术规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测鉴定结论		依据以上标准规范要求，对该矿通风系统进行了检测鉴定，结果详见第 3 章“检测检验项目”。 综合判定：该矿通风系统综合指标合格。 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 24 日		
检测检验组成员		胡春林、饶佛元		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 30 日		

批准：　　审核：　　主检：饶佛元

日期：2026.4.24　　日期：2026.4.24　　日期：2026.4.24

仅用于项目公示使用

4 必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	 
相关图表	通风系统检测点位布置图见附件

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE11-26015

金属非金属地下矿山通风系统

检测鉴定报告

委 托 单 位：	沧源县云矿金腊资源有限公司
受 检 单 位：	沧源县云矿金腊资源有限公司沧源县芒哈铅锌矿
项 目 名 称：	芒哈铅锌矿通风系统检测鉴定
检测检验地点：	芒哈铅锌矿矿井系统
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 4 月 1 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属地下矿山通风系统检测鉴定报告

报告编号：Q/YNGH-RE11-26015　　共 30 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
项目名称		芒哈铅锌矿通风系统检测鉴定		
生产规模		3 万吨/年	主通风机数量（台）	1
检测项目状态		矿井处于正常生产状态，现场检测时主通风机正常运行		
检测检验地点		芒哈铅锌矿矿井系统	检测检验日期	2026 年 4 月 1 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司沧源县芒哈铅锌矿		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测鉴定项目		风量（风速）合格率、风源风质合格率、作业场所空气质量合格率、有效风量率、风机效率、风量供需比、综合指标。		
检测鉴定依据		1、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 2、KA 30-2026《金属非金属地下矿山通风技术规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测鉴定结论		依据以上标准规范要求，对该矿通风系统进行了检测鉴定，结果详见第 3 章“检测检验项目”。 综合判定：该矿通风系统综合指标合格。 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 24 日		
检测检验组成员		胡春林、饶俐元		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 31 日		

批准：　　审核：　　主检：饶俐元

日期：2026.4.24　　日期：2026.4.24　　日期：2026.4.24

仅用于项目公示使用

4 必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	 
相关图表	通风系统检测点位布置图见附件

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE11-26016

金属非金属地下矿山通风系统

检测鉴定报告

委 托 单 位：	沧源县云矿金腊资源有限公司
受 检 单 位：	沧源县云矿金腊资源有限公司沧源县金腊铅锌银矿
项 目 名 称：	金腊铅锌银矿通风系统检测鉴定
检测检验地点：	金腊铅锌银矿矿井系统
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 3 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属地下矿山通风系统检测鉴定报告

报告编号：Q/YNGH-RE11-26016　　共 29 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇南腊村		
项目名称		金腊铅锌银矿通风系统检测鉴定		
生产规模		9.00 万吨/年	主通风机数量（台）	1
检测项目状态		矿井处于正常生产状态，现场检测时主通风机正常运行		
检测检验地点		金腊铅锌银矿矿井系统	检测检验日期	2026 年 3 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司沧源县金腊铅锌银矿		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇南腊村		
检测鉴定项目		风量（风速）合格率、风源风质合格率、作业场所空气质量合格率、有效风量率、风机效率、风量供需比、综合指标。		
检测鉴定依据		1、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 2、KA 30-2026《金属非金属地下矿山通风技术规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测鉴定结论		依据以上标准规范要求，对该矿通风系统进行了检测鉴定，结果详见第 3 章“检测检验项目”。 **综合判定：**该矿通风系统综合指标合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 24 日		
检测检验组成员		胡春林、饶佛元		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 30 日		

批准：　　审核：　　主检：胡春林

日期：2026.4.24　　日期：2026.4.24　　日期：2026.4.24

4 必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	   
相关图表	通风系统检测点位布置图见附件

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE15-26011

金属非金属矿山在用电力变压器

安全检测检验报告

委 托 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

受 检 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

设 备 名 称：电力变压器

型 号 规 格：S11-200/10

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 3 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力变压器安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE15-26011　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇南腊村		
设备名称		电力变压器	设备编号	1/07329
型号规格		S11-200/10	出厂日期	2017.08
制造单位		中国徐州永刚电力设备有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1250 平巷口	检测检验日期	2026 年 3 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇南腊村		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》		
存在问题及建议		无		
综合判定：		合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 28 日		
检测检验组成员		王宇、李若胜		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 30 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.4.28　　日期：2026.4.28　　日期：2026.4.28

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE15-26012

金属非金属矿山在用电力变压器
安全检测检验报告

委 托 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

受 检 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

设 备 名 称：电力变压器

型 号 规 格：S9-100/10

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 3 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 6301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力变压器安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE15-26012　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇南腊村		
设备名称		电力变压器	设备编号	06057
型号规格		S9-100/10	出厂日期	2006.04
制造单位		云南临沧变压器有限责任公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1490 平巷口	检测检验日期	2026 年 3 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇南腊村		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》		
存在问题及建议		无		
综合判定：		合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 28 日		
检测检验组成员		王宇、李若胜		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 30 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.4.28　　日期：2026.4.28　　日期：2026.4.28

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE15-26013

金属非金属矿山在用电力变压器
安全检测检验报告

委 托 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

受 检 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

设 备 名 称：电力变压器

型 号 规 格：S9-400/10

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 4 月 1 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力变压器安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE15-26013　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇南腊村		
设备名称		电力变压器	设备编号	0602164
型号规格		S9-400/10	出厂日期	2006.12
制造单位		上海申工变压器有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1040 中段	检测检验日期	2026 年 4 月 1 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇南腊村		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》		
存在问题及建议		无		
综合判定：		合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 28 日		
检测检验组成员		王宇、李若胜		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 31 日		

批准：　　审核：　　主检：王宇

日期：2026.4.28　　日期：2026.4.28　　日期：2026.4.28

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE24.1-26002

金属非金属地下矿山监测监控系统

安全检测检验报告

委 托 单 位：	沧源县云矿金腊资源有限公司
受 检 单 位：	沧源县云矿金腊资源有限公司（老厂矿区）
设 备 名 称：	金属非金属地下矿山监测监控系统
型 号 规 格：	KJ90X
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 3 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属地下矿山监测监控系统安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE24.1-26002　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
系统名称		金属非金属地下矿山监测监控系统		
施工完成日期		/	验收日期	/
系统状态		在用		
检测检验地点		监控室、井下各分段设备安装地点	检测检验日期	2026 年 3 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（老厂矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T 2053-2016《金属非金属地下矿山监测监控系统通用技术要求》；AQ2031-2011《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》。		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 22 日		
检测检验组成员		李若胜、王[illegible]		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 30 日		

批准：[illegible]　　审核：[illegible]　　主检：[illegible]

日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22

仅用于项目公示使用

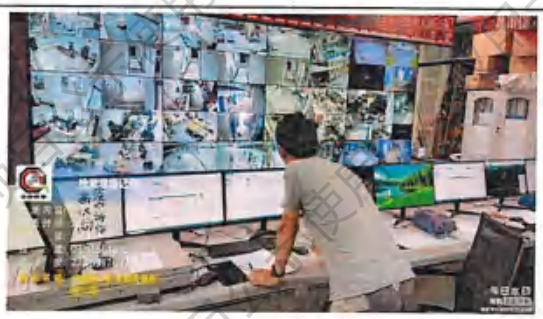
四、必要的图表、图片

系统设备及现场照片

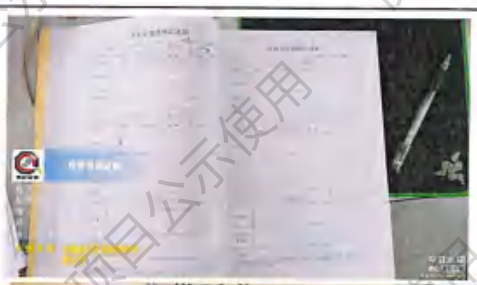
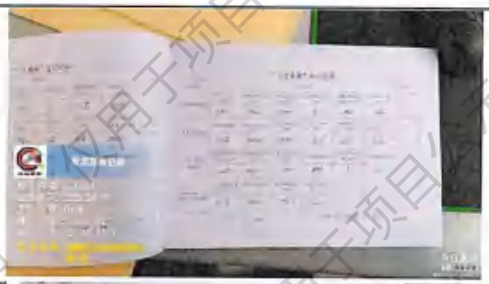
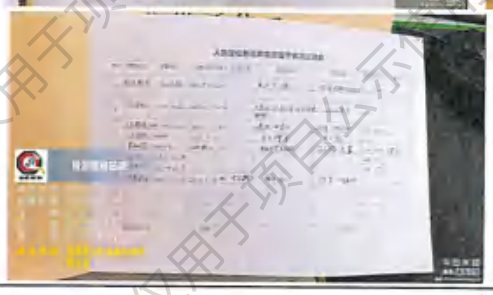






现场检测照片

系统软件及台账照片

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE24.1-26003

金属非金属地下矿山监测监控系统

安全检测检验报告

委 托 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

受 检 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司（金腊矿区）

设 备 名 称：金属非金属地下矿山监测监控系统

型 号 规 格：KJ90X

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 3 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属地下矿山监测监控系统安全检测检验报告

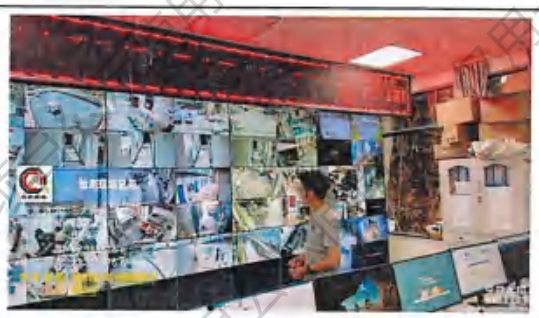

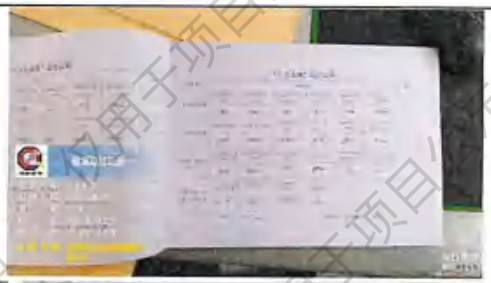

报告编号：Q/YNGH-RE24.1-26003　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
系统名称		金属非金属地下矿山监测监控系统		
施工完成日期		/	验收日期	/
系统状态		在用		
检测检验地点		监控室、井下各分段设备安装地点	检测检验日期	2026 年 3 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（金腊矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T 2053-2016《金属非金属地下矿山监测监控系统通用技术要求》；AQ2031-2011《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》。		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 22 日		
检测检验组成员		李若胜、王宇		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 30 日。		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22

四、必要的图表、图片

系统设备及现场照片	   
现场检测照片	 
系统软件及台账照片	   

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE24.1-26004

金属非金属地下矿山监测监控系统

安全检测检验报告

委 托 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

受 检 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司（芒哈矿区）

设 备 名 称：金属非金属地下矿山监测监控系统

型 号 规 格：KJ90X

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 4 月 1 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属地下矿山监测监控系统安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE24.1-26004　　共 12 页　第 1 页

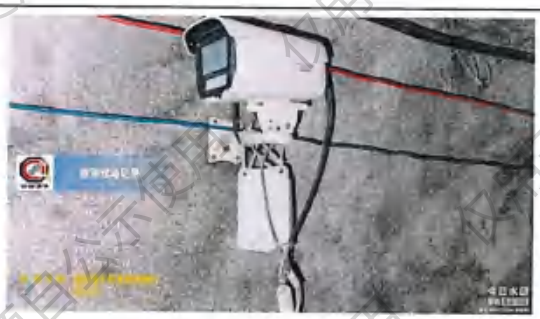
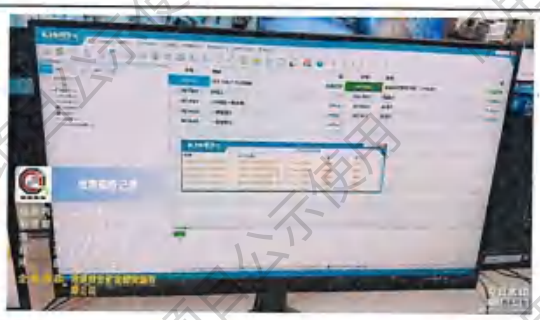

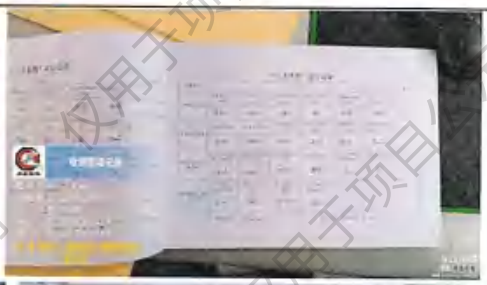
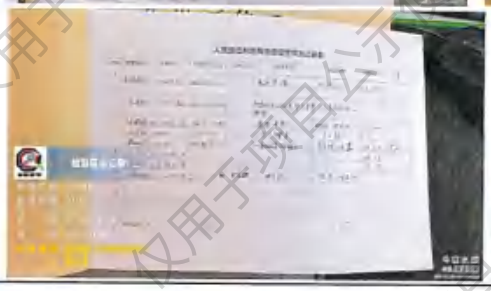
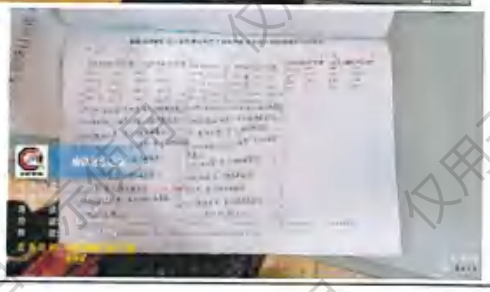
委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
系统名称		金属非金属地下矿山监测监控系统		
施工完成日期		/	验收日期	/
系统状态		在用		
检测检验地点		监控室、井下各分段设备安装地点	检测检验日期	2026 年 4 月 1 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（芒哈矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T 2053-2016《金属非金属地下矿山监测监控系统通用技术要求》；AQ2031-2011《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》。		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 22 日		
检测检验组成员		李若胜、王宇		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 31 日。		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

系统设备及现场照片	   
现场检测照片	 
系统软件及台账照片	   

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE24.2-26002

金属非金属地下矿山在用人员定位系统

安全检测检验报告

委 托 单 位：	沧源县云矿金腊资源有限公司
受 检 单 位：	沧源县云矿金腊资源有限公司（老厂矿区）
设 备 名 称：	金属非金属地下矿山人员定位系统
型 号 规 格：	KJ678J
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 3 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属地下矿山在用人员定位系统安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE24.2-26002　　共 11 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
系统名称		金属非金属地下矿山人员定位系统		
施工完成日期		/	验收日期	/
系统状态		在用		
检测检验地点		监控室、井下各分段设备安装地点	检测检验日期	2026 年 3 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（老厂矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T2080-2023《金属非金属地下矿山在用人员定位系统安全检测检验规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论

项目类型	A 类不合格	B 类不合格	C 类不合格	B+C 类不合格
合格条件	0	＜2	＜4	B 类＜1 且 C 类＜2
检测结果	0	0	1	B：0 项　C：1 项

综合判定：合格

（检测检验专用章）

2026 年 4 月 22 日

检测检验组成员	李若胜、王宇
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 30 日。

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

系统设备证书照片	   
现场检测照片	 

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE24.2-26003

金属非金属地下矿山在用人员定位系统

安全检测检验报告

委 托 单 位：	沧源县云矿金腊资源有限公司
受 检 单 位：	沧源县云矿金腊资源有限公司（金腊矿区）
设 备 名 称：	金属非金属地下矿山人员定位系统
型 号 规 格：	KJ678J
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 3 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属地下矿山在用人员定位系统安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE24.2-26003　　共 11 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
系统名称		金属非金属地下矿山人员定位系统		
施工完成日期		/	验收日期	/
系统状态		在用		
检测检验地点		监控室、井下各分段设备安装地点	检测检验日期	2026 年 3 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（金腊矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T2080-2023《金属非金属地下矿山在用人员定位系统安全检测检验规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论

项目类型	A 类不合格	B 类不合格	C 类不合格	B+C 类不合格
合格条件	0	＜2	＜4	B 类＜1 且 C 类＜2
检测结果	0	0	1	B：0 项　C：1 项

综合判定：合格

（检测检验专用章）

2026 年 4 月 22 日

检测检验组成员	李若胜、王宇
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 30 日。

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

系统设备证书照片	   
现场检测照片	 

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE24.2-26004

金属非金属地下矿山在用人员定位系统

安全检测检验报告

委 托 单 位：	沧源县云矿金腊资源有限公司
受 检 单 位：	沧源县云矿金腊资源有限公司（芒哈矿区）
设 备 名 称：	金属非金属地下矿山人员定位系统
型 号 规 格：	KJ678J
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 4 月 1 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属地下矿山在用人员定位系统安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE24.2-26004　　共 11 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
系统名称		金属非金属地下矿山人员定位系统		
施工完成日期		/	验收日期	/
系统状态		在用		
检测检验地点		监控室、井下各分段设备安装地点	检测检验日期	2026 年 4 月 1 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（芒哈矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T2080-2023《金属非金属地下矿山在用人员定位系统安全检测检验规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论					
	项目类型	A 类不合格	B 类不合格	C 类不合格	B+C 类不合格
	合格条件	0	<2	<4	B 类<1 且 C 类<2
	检测结果	0	0	1	B：0 项　C：1 项
	综合判定：合格				
	（检测检验专用章） 2026 年 4 月 22 日				
检测检验组成员	李若胜、王宇				
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 31 日。				

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22

四、必要的图表、图片

系统设备证书照片	   
现场检测照片	 

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE24.3-26002

金属非金属地下矿山通信联络系统

安全检测检验报告

委 托 单 位：	沧源县云矿金腊资源有限公司
受 检 单 位：	沧源县云矿金腊资源有限公司（老厂矿区）
设 备 名 称：	金属非金属地下矿山通信联络系统
型 号 规 格：	KTJ129(A)
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 3 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属地下矿山通信联络系统安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE24.3-26002　　共 9 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
系统名称		金属非金属地下矿山通信联络系统		
施工完成日期		/	验收日期	/
系统状态		在用		
检测检验地点		监控室、井下各分段设备安装地点	检测检验日期	2026 年 3 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（老厂矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T 2052-2016《金属非金属地下矿山通信联络系统通用技术要求》；AQ 2036-2011《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》。		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 24 日		
检测检验组成员		李若胜、玉宇		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 30 日。		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.5.25　　日期：2026.5.25　　日期：2026.5.25

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

系统各设备证书照片	  
现场检测照片	 
备注	/

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE24.3-26003

金属非金属地下矿山通信联络系统

安全检测检验报告

委 托 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

受 检 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司（金腊矿区）

设 备 名 称：金属非金属地下矿山通信联络系统

型 号 规 格：KTJ129(A)

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 3 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

云南高华安全生产检测检验有限公司 检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属地下矿山通信联络系统安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE24.3-26003　　共 9 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
系统名称		金属非金属地下矿山通信联络系统		
施工完成日期		/	验收日期	/
系统状态		在用		
检测检验地点		监控室、井下各分段设备安装地点	检测检验日期	2026 年 3 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（金腊矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T 2052-2016《金属非金属地下矿山通信联络系统通用技术要求》；AQ 2036-2011《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》。		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 2 日		
检测检验组成员		李若胜、王宇		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 30 日。		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.5.25　　日期：2026.5.25　　日期：2026.5.25

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

系统各设备证书照片	  
现场检测照片	 
备注	/

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE24.3-26004

金属非金属地下矿山通信联络系统

安全检测检验报告

委 托 单 位：	沧源县云矿金腊资源有限公司
受 检 单 位：	沧源县云矿金腊资源有限公司（芒哈矿区）
设 备 名 称：	金属非金属地下矿山通信联络系统
型 号 规 格：	KTJ129(A)
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 4 月 1 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207018

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属地下矿山通信联络系统安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE24.3-26004　　共 9 页　第 1 页

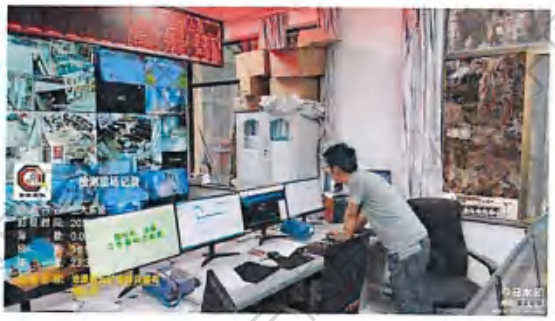
委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
系统名称		金属非金属地下矿山通信联络系统		
施工完成日期		/	验收日期	/
系统状态		在用		
检测检验地点		监控室、井下各分段设备安装地点	检测检验日期	2026 年 4 月 1 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（芒哈矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T 2052-2016《金属非金属地下矿山通信联络系统通用技术要求》；AQ 2036-2011《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》。		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 27 日		
检测检验组成员		李若胜、王宇		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 31 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.5.25　　日期：2026.5.24　　日期：2026.5.25

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

系统各设备证书照片	  
现场检测照片	 
备注	/

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE26-26001

金属非金属矿山在用局部通风机

安全检测检验报告

委 托 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

受 检 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司（老厂矿区）

设 备 名 称：矿用隔爆型轴流式局部通风机

型 号 规 格：No 5.0/11

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 3 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用局部通风机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE26-26001　　共 9 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
设备名称		矿用隔爆型轴流式局部通风机	设备编号	C3334
型号规格		№ 5.0/11	出厂日期	2025 年 5 月
制造单位		萍乡市南风防爆风机有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1250 采场进风巷	检测检验日期	2026 年 3 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（老厂矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		1、JB/T 9100-2014《矿井局部通风机 技术条件》 2、AQ 2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		依据上述标准规范，通过现场检测检验，该通风机所检项目均符合标准要求。 **综合判定：** 合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 22 日		
检测检验组成员		李若胜、饶佛元		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 30 日		

批准：　日期：2026.4.22

审核：　日期：2026.4.22

主检：　日期：2026.4.22

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE26-26002

金属非金属矿山在用局部通风机

安全检测检验报告

委 托 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

受 检 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司（老厂矿区）

设 备 名 称：矿用隔爆型轴流式局部通风机

型 号 规 格：No 5.0/11

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 3 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用局部通风机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE26-26002　　共 9 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
设备名称		矿用隔爆型轴流式局部通风机	设备编号	C3338
型号规格		№ 5.0/11	出厂日期	2025 年 5 月
制造单位		萍乡市南风防爆风机有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1300 分层回风巷道 6-2# 局扇	检测检验日期	2026 年 3 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（老厂矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		1、JB/T 9100-2014《矿井局部通风机 技术条件》 2、AQ 2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		依据上述标准规范，通过现场检测检验，该通风机所检项目均符合标准要求。 **综合判定：**合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 22 日		
检测检验组成员		李若胜、饶佛元		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 30 日		

批准：　日期：2026.4.22

审核：　日期：2026.4.22

主检：　日期：2026.4.22

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE26-26003

金属非金属矿山在用局部通风机

安全检测检验报告

委 托 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

受 检 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司（老厂矿区）

设 备 名 称：矿用隔爆型轴流式局部通风机

型 号 规 格：No 5.0/11

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 3 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用局部通风机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE26-26003　　共 9 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
设备名称		矿用隔爆型轴流式局部通风机	设备编号	/
型号规格		№5.0/11	出厂日期	/
制造单位		萍乡市南风防爆风机有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1300 回风巷 3-5#局扇	检测检验日期	2026 年 3 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（老厂矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		1、JB/T 9100-2014《矿井局部通风机 技术条件》 2、AQ 2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		依据上述标准规范，通过现场检测检验，该通风机所检项目均符合标准要求。 **综合判定：**合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 22 日		
检测检验组成员		李若胜、饶佛元		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 30 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22　　日期：2026-4-22

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE26-26004

金属非金属矿山在用局部通风机
安全检测检验报告

委 托 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

受 检 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司（金腊矿区）

设 备 名 称：矿用隔爆型压入式轴流局部通风机

型 号 规 格：FBYNo5.0/7.5

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026年3月31日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用局部通风机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE26-26004　　共 9 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
设备名称		矿用隔爆型压入式轴流局部通风机	设备编号	1115
型号规格		FBYNo5.0/7.5	出厂日期	2024 年 11 月
制造单位		萍乡市南风防爆风机有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1490 中段三穿局扇	检测检验日期	2026 年 3 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（金腊矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		1、JB/T 9100-2014《矿井局部通风机 技术条件》 2、AQ 2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		依据上述标准规范，通过现场检测检验，该通风机所检项目均符合标准要求。 **综合判定：**合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 22 日		
检测检验组成员		李若胜、饶佛元		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 30 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE26-26005

金属非金属矿山在用局部通风机

安全检测检验报告

委 托 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

受 检 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司（金腊矿区）

设 备 名 称：矿用隔爆型压入式轴流局部通风机

型 号 规 格：FBYNo05.0/7.5

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 3 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用局部通风机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE26-26005　　共 9 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
设备名称		矿用隔爆型压入式轴流局部通风机	设备编号	/
型号规格		FBYNo05.0/7.5	出厂日期	/
制造单位		萍乡市南风防爆风机有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1490 中段四穿局扇	检测检验日期	2026 年 3 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（金腊矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		1、JB/T 9100-2014《矿井局部通风机 技术条件》 2、AQ 2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		依据上述标准规范，通过现场检测检验，该通风机所检项目均符合标准要求。 综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 22 日		
检测检验组成员		李若胜、饶佛元		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 30 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE26-26006

金属非金属矿山在用局部通风机
安全检测检验报告

委 托 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

受 检 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司（金腊矿区）

设 备 名 称：矿用隔爆型轴流式局部通风机

型 号 规 格：YBT52-2

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 3 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207010

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用局部通风机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE26-26006　　共 9 页　第 1 页

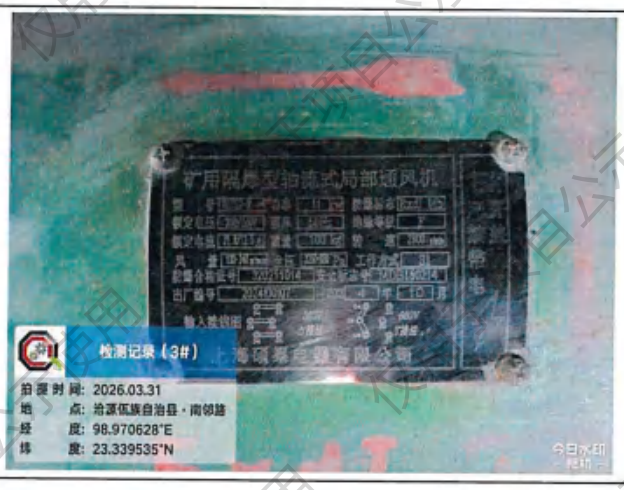
委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
设备名称		矿用隔爆型轴流式局部通风机	设备编号	2024100107
型号规格		YBT52-2	出厂日期	2024 年 10 月
制造单位		上海硕果电气有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1525 中段采掘面	检测检验日期	2026 年 3 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（金腊矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		1、JB/T 9100-2014《矿井局部通风机 技术条件》 2、AQ 2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		依据上述标准规范，通过现场检测检验，该通风机所检项目均符合标准要求。 **综合判定：**合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 22 日		
检测检验组成员		李若胜、饶佛元		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 30 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE26-26007

金属非金属矿山在用局部通风机
安全检测检验报告

委 托 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

受 检 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司（芒哈矿区）

设 备 名 称：矿用隔爆型轴流式局部通风机

型 号 规 格：YBT42-2

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026年4月1日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用局部通风机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE26-26007　　共 9 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
设备名称		矿用隔爆型轴流式局部通风机	设备编号	/
型号规格		YBT42-2	出厂日期	/
制造单位		上海硕果电气有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1#人行材料井 1118 分层 1#回采进路局扇	检测检验日期	2026 年 4 月 1 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（芒哈矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		1、JB/T 9100-2014《矿井局部通风机 技术条件》 2、AQ 2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		依据上述标准规范，通过现场检测检验，该通风机所检项目均符合标准要求。 **综合判定：**合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 22 日		
检测检验组成员		李若胜、饶佛元		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 31 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE26-26008

金属非金属矿山在用局部通风机
安全检测检验报告

委 托 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

受 检 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司（芒哈矿区）

设 备 名 称：矿用隔爆型压入式局部轴流通风机

型 号 规 格：FBY-11

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 4 月 1 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用局部通风机安全检测检验报告

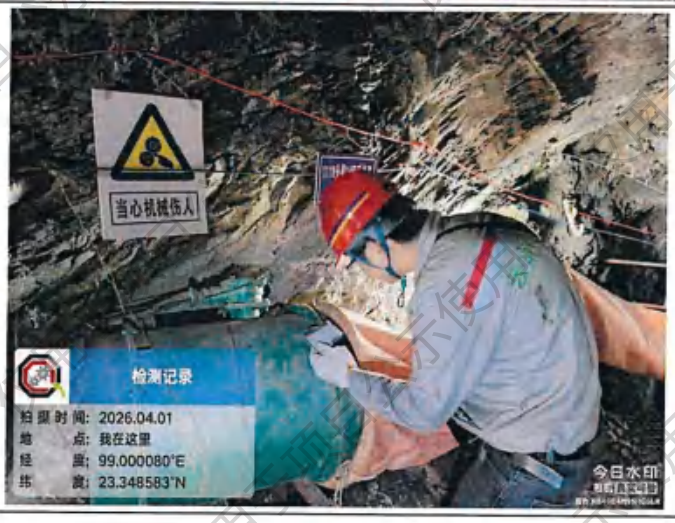
报告编号：Q/YNGH-RE26-26008　　共 9 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
设备名称		矿用隔爆型压入式局部轴流通风机	设备编号	20220825
型号规格		FBY-11	出厂日期	2022 年 6 月
制造单位		上海科祥防爆机电有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		2#人行材料井 1118 分层 1#回采进路局扇	检测检验日期	2026 年 4 月 1 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（芒哈矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		1、JB/T 9100-2014《矿井局部通风机 技术条件》 2、AQ 2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		依据上述标准规范，通过现场检测检验，该通风机所检项目均符合标准要求。 **综合判定：**合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 22 日		
检测检验组成员		李若胜、饶佛元		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 31 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE26-26009

金属非金属矿山在用局部通风机
安全检测检验报告

委 托 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

受 检 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司（芒哈矿区）

设 备 名 称：矿用隔爆型压入式轴流局部通风机

型 号 规 格：FBYNo5.0/7.5

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 4 月 1 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用局部通风机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE26-26009　　共 9 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
设备名称		矿用隔爆型压入式轴流局部通风机	设备编号	0331
型号规格		FBYNo5.0/7.5	出厂日期	2025 年 3 月
制造单位		萍乡市南风防爆风机有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1090 中段西沿平巷二穿局扇	检测检验日期	2026 年 4 月 1 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（芒哈矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		1、JB/T 9100-2014《矿井局部通风机 技术条件》 2、AQ 2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		依据上述标准规范，通过现场检测检验，该通风机所检项目均符合标准要求。 **综合判定：**合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 22 日		
检测检验组成员		李若胜、饶佛元		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 31 日		

批准：　日期：2026.4.22

审核：　日期：2026.4.22

主检：　日期：2026.4.22

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE26-26011

金属非金属矿山在用局部通风机

安全检测检验报告

委 托 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司

受 检 单 位：沧源县云矿金腊资源有限公司（芒哈矿区）

设 备 名 称：矿用隔爆型压入式轴流局部通风机

型 号 规 格：FBYNo5.0/7.5

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026年4月1日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

S3010022070 16

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用局部通风机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE26-26011　　共 9 页　第 1 页

委托单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
设备名称		矿用隔爆型压入式轴流局部通风机	设备编号	0335
型号规格		FBYNo05.0/7.5	出厂日期	2025 年 3 月
制造单位		萍乡市南风防爆风机有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1090 中段西沿平巷一穿局扇	检测检验日期	2026 年 4 月 1 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	沧源县云矿金腊资源有限公司（芒哈矿区）		
	地址	云南省临沧市沧源县芒卡镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		1、JB/T 9100-2014《矿井局部通风机 技术条件》 2、AQ 2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		依据上述标准规范，通过现场检测检验，该通风机所检项目均符合标准要求。 **综合判定：** 合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 22 日		
检测检验组成员		李若胜、饶佛元		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 31 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22　　日期：2026.4.22

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

仅用于项目公示使用
